

COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

Area Tecnico-Urbanistica - LL.PP.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 - MISURA 125,
AZIONE 3 - MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI IDRICHE RURALI NELLE
LOCALITA' VALLECIMARA - SCAROLI

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Data : MAGGIO 2014

IL TECNICO
(U.T.C.)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
	2	E	1	1	02/02/2015	02/02/2015
	3	E	1	1	02/03/2015	02/03/2015
	4	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
	5	E	1	1	04/05/2015	04/05/2015
	6	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
	2	E	1	1	02/02/2015	02/02/2015
	3	E	1	1	02/03/2015	02/03/2015
	4	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
	5	E	1	1	04/05/2015	04/05/2015
	6	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
	2	E	1	1	02/02/2015	02/02/2015
	3	E	1	1	02/03/2015	02/03/2015
	4	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
	5	E	1	1	04/05/2015	04/05/2015
	6	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	12/01/2015	12/01/2015
	2	E	1	1	02/02/2015	02/02/2015
	3	E	1	1	02/03/2015	02/03/2015
	4	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
	5	E	1	1	04/05/2015	04/05/2015
	6	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	13/01/2015	13/01/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/01/2015	13/01/2015
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/01/2015	13/01/2015
Smobilizzo del cantiere	7	E	2	2	29/06/2015	30/06/2015
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO (esterno)						
Scavo a sezione obbligata esterno	1	E	2	2	15/01/2015	16/01/2015
	2	E	6	8	03/02/2015	10/02/2015
	3	E	2	2	04/03/2015	05/03/2015
	4	E	6	9	02/04/2015	10/04/2015
	5	E	6	8	05/05/2015	12/05/2015
	6	E	6	8	03/06/2015	10/06/2015
Rinterro di scavo	1	E	2	2	27/01/2015	28/01/2015

Tabella Analitica Gantt

	2	E	3	3	25/02/2015	27/02/2015
	3	E	3	3	24/03/2015	26/03/2015
	4	E	3	3	28/04/2015	30/04/2015
	5	E	3	3	27/05/2015	29/05/2015
	6	E	3	3	24/06/2015	26/06/2015
SERVIZI E IMPIANTI A RETE						
Posa di conduttura idrica	1	E	4	4	19/01/2015	22/01/2015
	2	E	10	14	11/02/2015	24/02/2015
	3	E	4	6	06/03/2015	11/03/2015
	4	E	11	15	13/04/2015	27/04/2015
	5	E	10	14	13/05/2015	26/05/2015
	6	E	9	13	11/06/2015	23/06/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	2	4	23/01/2015	26/01/2015
	2	E	10	14	11/02/2015	24/02/2015
	3	E	2	2	12/03/2015	13/03/2015
	4	E	11	15	13/04/2015	27/04/2015
	5	E	10	14	13/05/2015	26/05/2015
	6	E	9	13	11/06/2015	23/06/2015
Posa di conduttura elettrica	1	E	4	4	19/01/2015	22/01/2015
	2	E	10	14	11/02/2015	24/02/2015
	3	E	4	6	06/03/2015	11/03/2015
	4	E	11	15	13/04/2015	27/04/2015
	5	E	10	14	13/05/2015	26/05/2015
	6	E	9	13	11/06/2015	23/06/2015
STRADE						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	1	14/01/2015	14/01/2015
	3	E	1	1	03/03/2015	03/03/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	14/01/2015	14/01/2015
	3	E	1	1	03/03/2015	03/03/2015
Formazione di fondazione stradale	1	E	2	2	27/01/2015	28/01/2015
	3	E	3	3	16/03/2015	18/03/2015
Formazione di rilevato stradale	1	E	2	2	27/01/2015	28/01/2015
	3	E	3	5	19/03/2015	23/03/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	29/01/2015	30/01/2015
	3	E	3	5	27/03/2015	31/03/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA 1

2) = ZONA 2

3) = ZONA 3

4) = ZONA 4

5) = ZONA 5

6) = ZONA 6

7) = ZONA INTERO CANTIERE

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2015																												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	119 g	▼																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6 g	Z1 1																												
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	6 g	Z1 1																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	6 g	Z1 1																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1 1																												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1 1																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	6 g	Z1 1																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 1																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1 1																												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1 1																												
Smobilizzo del cantiere	2 g																													
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE	114 g	▼																												
Scavo a sezione obbligata esterno	28 g	Z1 2																												
Rinterro di scavo	17 g	Z1 2																												
SERVIZI E IMPIANTI A RETE	109 g	▼																												
Posa di condotta idrica	48 g	Z1 4																												
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	44 g	Z1 2																												
Posa di condotta elettrica	48 g	Z1 4																												
STRADE	55 g	▼																												
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g	Z1 1																												
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g	Z1 1																												
Formazione di fondazione stradale	5 g	Z1 2																												
Formazione di rilevato stradale	5 g	Z1 2																												
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g	Z1 2																												
LEGENDA Zona:																														
Z1 = ZONA 1																														
Z2 = ZONA 2																														
Z3 = ZONA 3																														
Z4 = ZONA 4																														
Z5 = ZONA 5																														
Z6 = ZONA 6																														
Z7 = ZONA INTERO CANTIERE																														

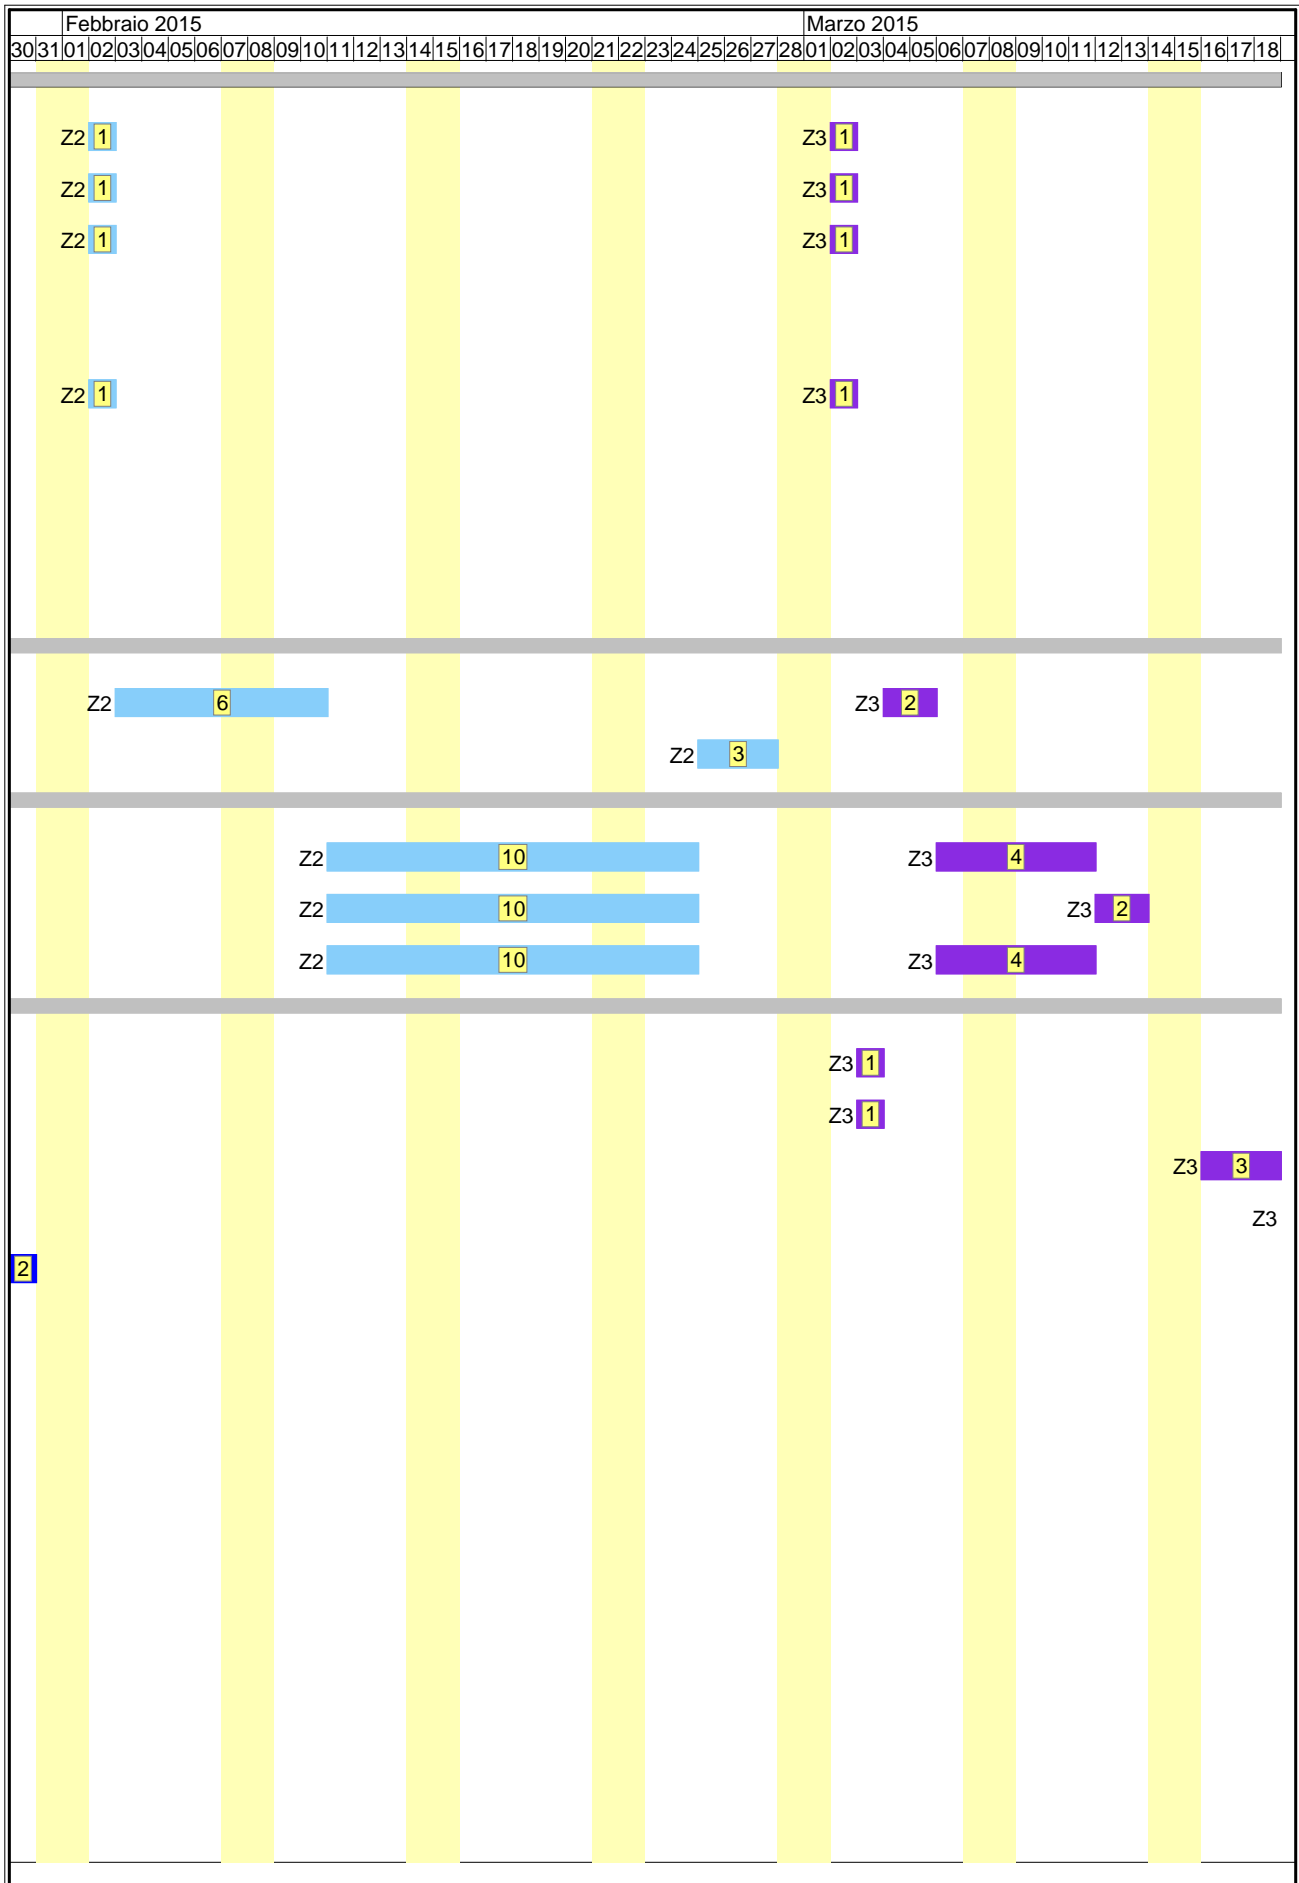

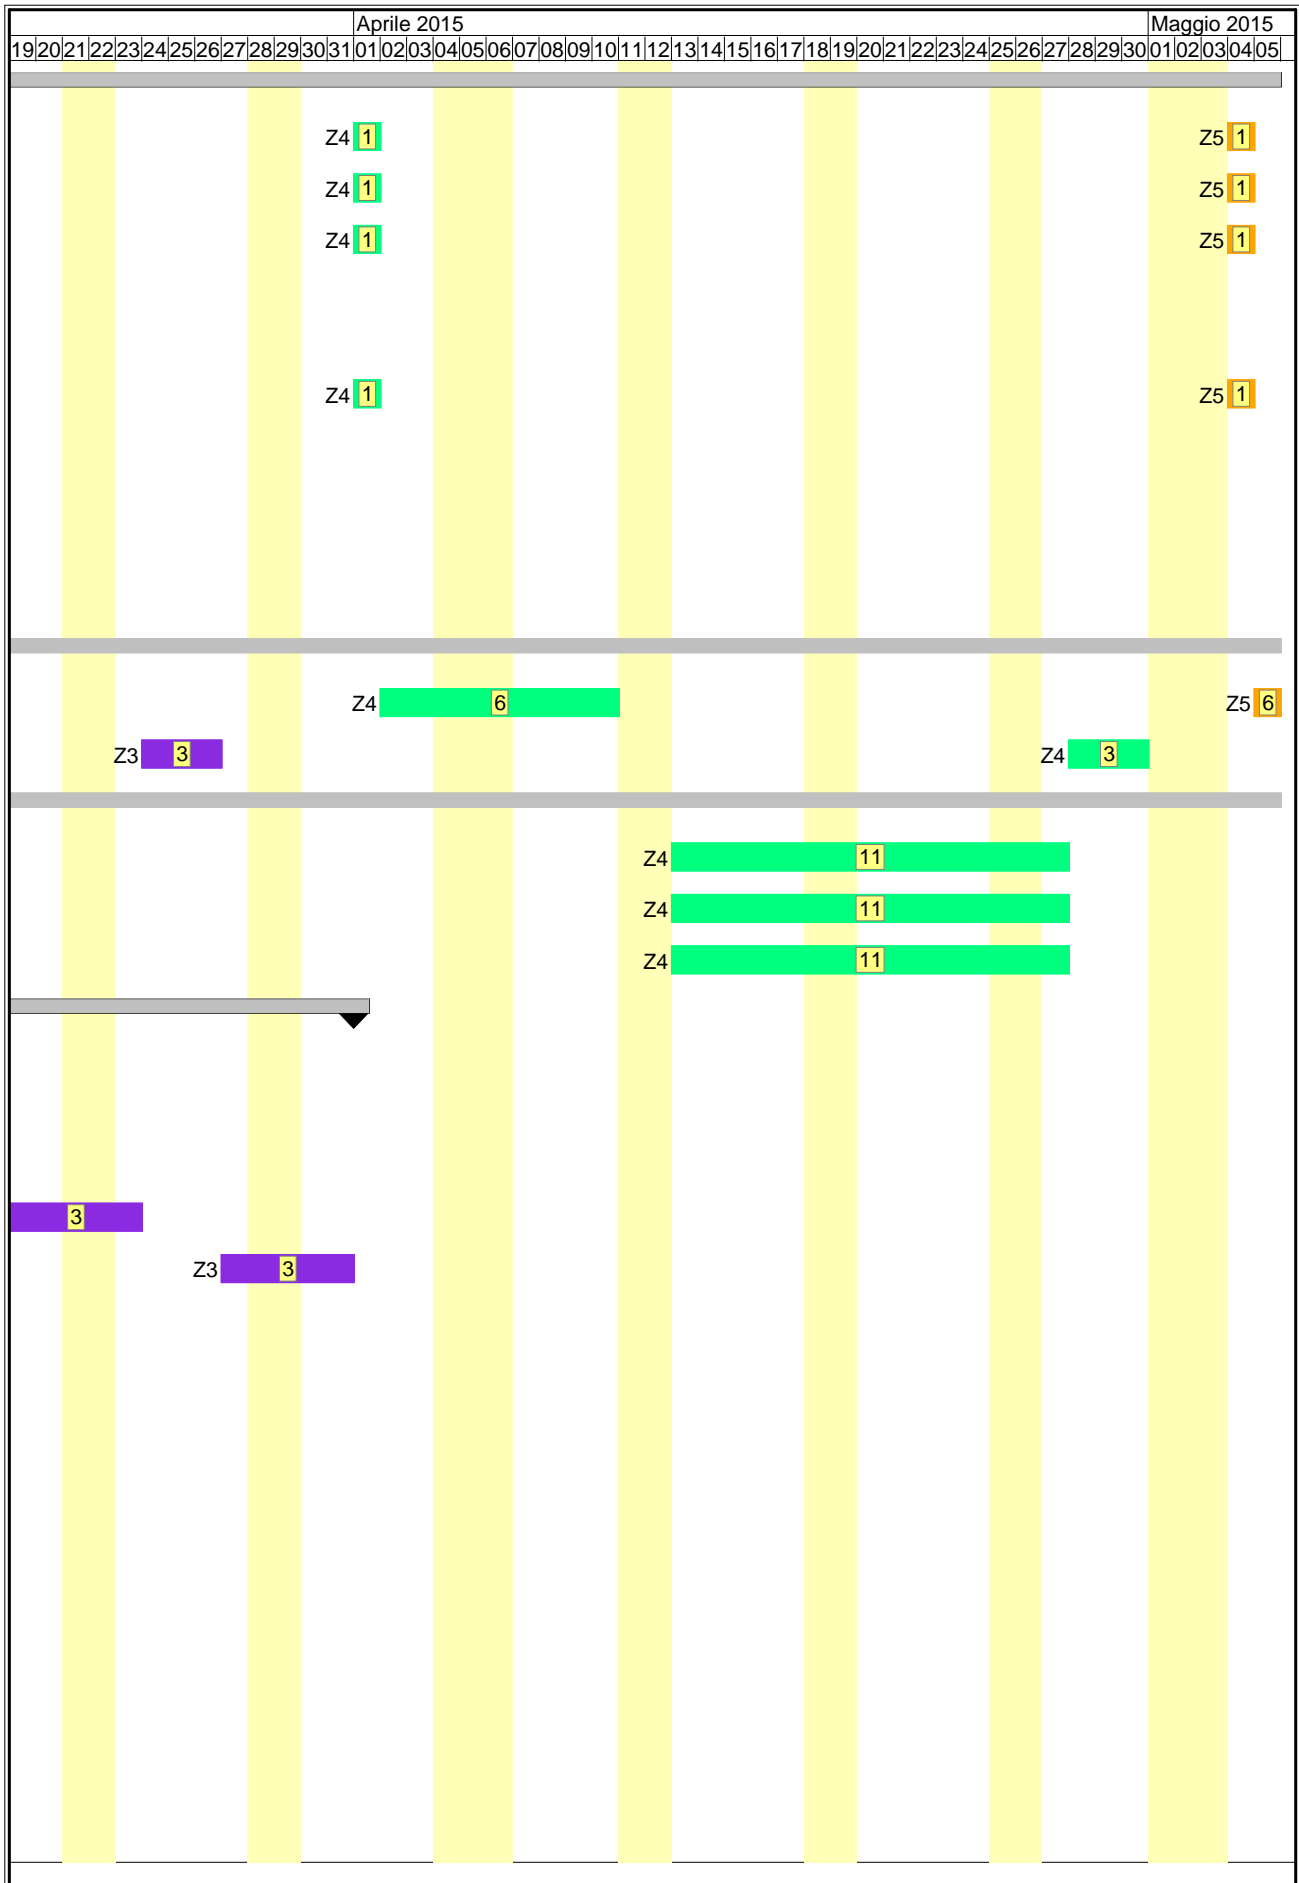

06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22

